


Le pilotage d'une DSI (auteur: Christian Duchesne, éditions de l'AFAI)

Annexe 4: indicateurs d'avancement fournis par les outils de planification anglo-saxons

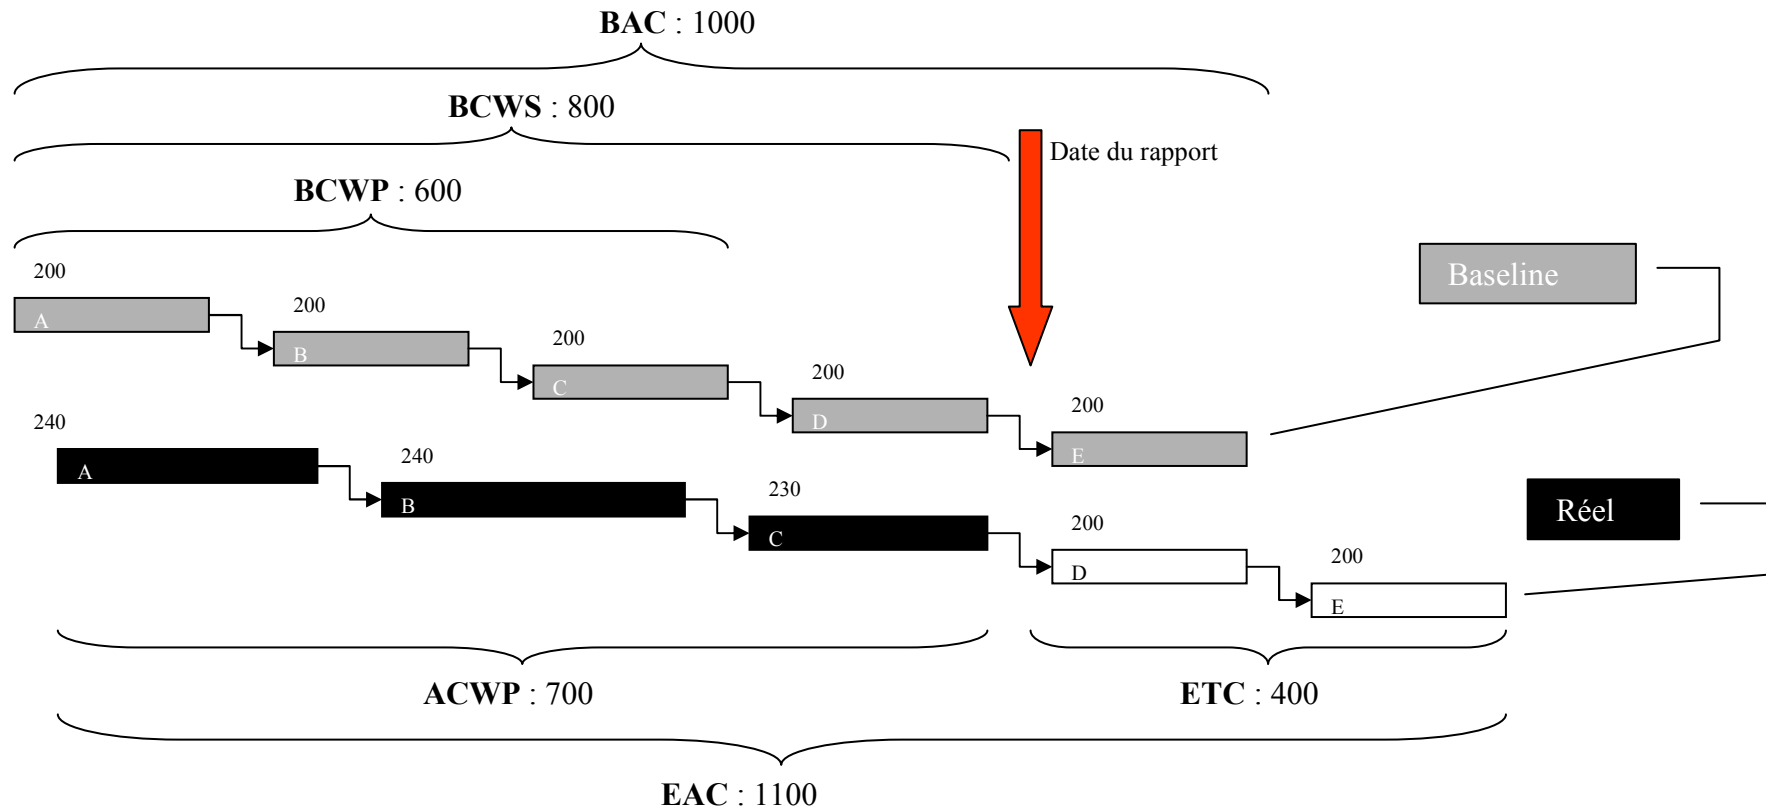


BVI (Budget Variance Indicator) = $EAC / BAC = \text{Total révisé du projet} / \text{baseline totale}$

CVI (Cost Variance Indicator) = $ACWP / BCWP = \text{Total consommé} / \text{Total prévu d'être consommé sur le périmètre des tâches complétées.}$

SVI (Schedule Variance Indicator) = $BCWP / BCWS = \text{Total des budgets des tâches réellement complétées} / \text{budget des tâches qui avaient été prévues d'être complétées.}$

Le pilotage d'une DSI (auteur: Christian Duchesne, éditions de l'AFAI)

Annexe 4: indicateurs d'avancement traduits en termes français

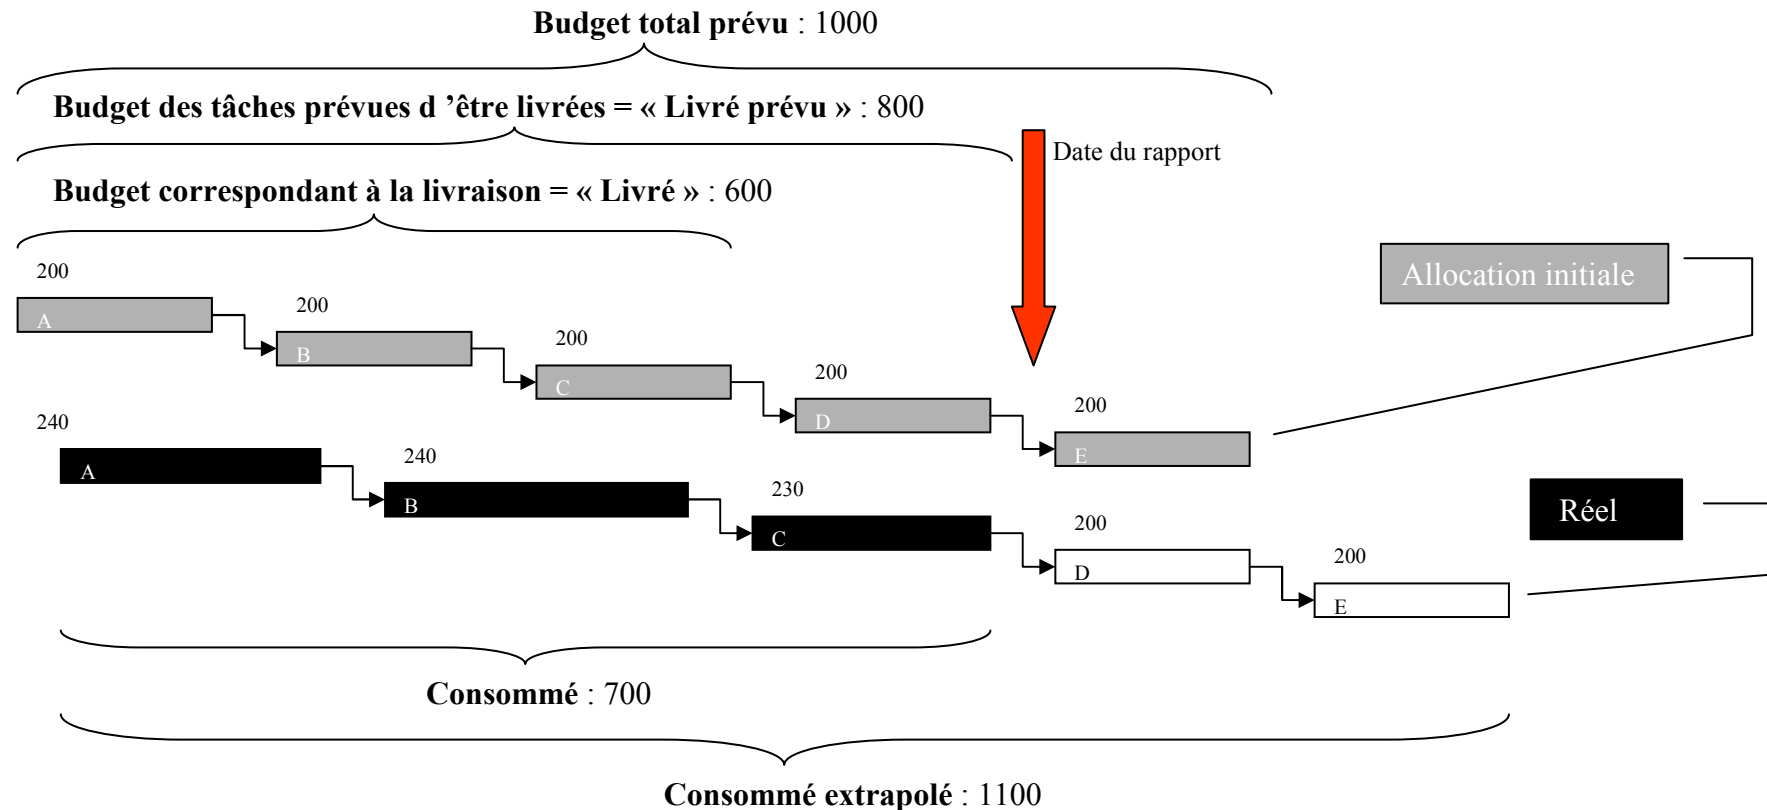

Retard (+) Avance (-) = Délai pour réaliser les tâches / Délai prévu initialement (☹ si > 20%)

Avancement à date = mesure du Retard en budget = Livré / Livré prévu (☹ si < 0.8)

Respect des coûts = (Consommé - Livré) / Livré (☹ si > 20%)

Efficacité = Livré / Consommé

Avancement global = Livré / Budget total prévu
